FATTORIA DIGITAL · IPIRANGA TRADE MARKETING

Proposta de projeto, **redesign da home e do checklist do App de Execução**

CLIENTE	Ipiranga · Trade Marketing
INTERLOCUÇÃO	Julio Araujo
PLATAFORMA	App de Execução, desenvolvido e mantido pela Stringhini
BASE	Dossiê de entendimento de 24/09 · estratégia do hub (set/2026) · estudo de campo de agosto · reunião de alinhamento de 15/10
NATUREZA	Proposta Comercial de horas em 2 jornadas de entrega
DATA	16 de outubro de 2026

01 Contexto e proposta de valor

A Ipiranga deseja transformar o App de Execução desenvolvido pela Stringhini em um **hub de trabalho** para o consultor de trade da empresa.

O app foi construído a partir das necessidades do negócio e precisa ter uma experiência em sua jornada à altura da sua importância. O hub precisa levar o consultor às suas tarefas, treinamentos e informações de forma ágil, e que apoie a sua operação.

Para avançar com velocidade e mostrar resultado ainda em 2026, o trabalho começa por duas jornadas: a **home do app (dashboard)**, que é a porta de entrada do consultor, e o **checklist**, que é o coração da operação em campo. Com essas duas jornadas entregues, a Ipiranga passa a ter uma referência clara de ritmo e capacidade de implementação para planejar as próximas.

> **A proposta de valor da Fattoria**
>
> A Fattoria quer ir além da entrega de telas prontas para a Stringhini. O objetivo desta proposta é redesenhar as duas jornadas com a visão de produto do projeto como um todo, em conversa próxima com a Stringhini, para que o que for desenhado possa ser implementado dentro do prazo. A entrega final das telas de cada jornada é feita em Figma, com as especificações necessárias para a implementação pelo time da Stringhini.

02 Como o trabalho acontece

O projeto segue o modelo por jornadas, em formato de esteira: a Ipiranga define a jornada do ponto de vista do negócio, a Fattoria desenha a interface e a Stringhini implementa. Enquanto a Stringhini implementa a primeira jornada, a Fattoria já trabalha na segunda. Assim as três partes avançam ao mesmo tempo e cada entrega chega à Stringhini em um tamanho que cabe no ritmo de desenvolvimento.

Quem faz o quê

QUEM	PAPEL	DECIDE
Ipiranga · Trade Marketing	Dona do negócio e da estratégia. Define as regras e prioridades de cada jornada e aprova as entregas.	Regras de negócio e aprovação
Fattoria · produto e design	Desenha fluxos e interfaces, combina a viabilidade com a Stringhini e especifica as telas para implementação.	Experiência e critérios de aceite das telas
Stringhini · engenharia	Avalia a viabilidade, implementa e mantém o app, como prevê o contrato vigente.	Solução técnica e estimativa de esforço

> **Entregar rápido e ajustar cedo**
>
> O objetivo de cada jornada é elevar o nível da ferramenta com uma boa entrega, levada cedo à Stringhini para que os ajustes técnicos aconteçam logo no início. As primeiras telas tendem a ter mais idas e vindas, enquanto as partes se alinham aos limites e padrões da plataforma. Por isso a estimativa de horas já reserva tempo para essas rodadas de ajuste, com base na experiência do app de Treinamento. A partir da segunda jornada, a tendência é de um ritmo mais estável.

Rituais

RITUAL	QUEM	PARA QUÊ
Definição da jornada · a partir dos wireframes	Ipiranga, Fattoria e Stringhini	Regras de negócio, limites técnicos e o que entra na jornada
Alinhamento · semanal	Trade Marketing e Fattoria	Andamento das etapas e aprovações
Técnica · semanal	Fattoria e Stringhini	Viabilidade e passagem de design
Fechamento da jornada	Ipiranga, Fattoria e Stringhini	Aprovação final e aprendizados para a próxima jornada

03 As duas jornadas do projeto

O projeto começa em 19/10 a partir do que a Ipiranga já entregou: a estratégia, o estudo de campo de agosto e o dossiê de 24/09. Cada jornada tem entregas definidas e um pacote de horas estimado.

Jornada 1 · Home do app (dashboard) · 19/10 a 13/11


ENTREGA	O QUE É	HORAS
Fluxo e wireframe	Estrutura da home, hierarquia das informações e caminhos para as demais áreas do app.	10h
Definição da jornada e conversa técnica	Encontro com Ipiranga e Stringhini, usando os wireframes como base, para fechar as regras de negócio e as informações da home e alinhar os componentes e padrões que a Stringhini já usa.	8h
Interface	Telas finais no Figma, com os estados de campo.	20h
Base visual	Primeiros componentes, cores, tipografia e ícones, adaptados às bibliotecas da Stringhini.	6h
Rodadas de ajuste	Idas e vindas com a Stringhini e a Ipiranga até as telas estarem prontas para implementar.	12h
Especificação e passagem	Telas anotadas, regras de comportamento e sessão de passagem para a Stringhini.	4h
Total da jornada 1		**60h**

Jornada 2 · Checklist · 09/11 a 18/12

ENTREGA	O QUE É	HORAS
Fluxo e wireframe	Início a partir do posto, progresso, perguntas obrigatórias, salvar e retomar, conclusão e relatório.	12h
Definição da jornada e conversa técnica	Encontro com Ipiranga e Stringhini, usando os wireframes como base, para fechar as regras do checklist, da conclusão e do relatório e alinhar os limites do motor de formulários e do funcionamento sem conexão.	6h
Interface	Telas finais no Figma, com os estados de campo e os componentes novos do checklist documentados.	26h
Rodadas de ajuste	Idas e vindas com a Stringhini e a Ipiranga até as telas estarem prontas para implementar.	12h
Especificação e passagem	Telas anotadas, regras de comportamento e sessão de passagem para a Stringhini.	4h
Total da jornada 2		**60h**

Cronograma

Distribuição das entregas nas nove semanas do projeto. A implementação aparece como referência e é conduzida pela Stringhini, a partir da passagem de cada jornada.

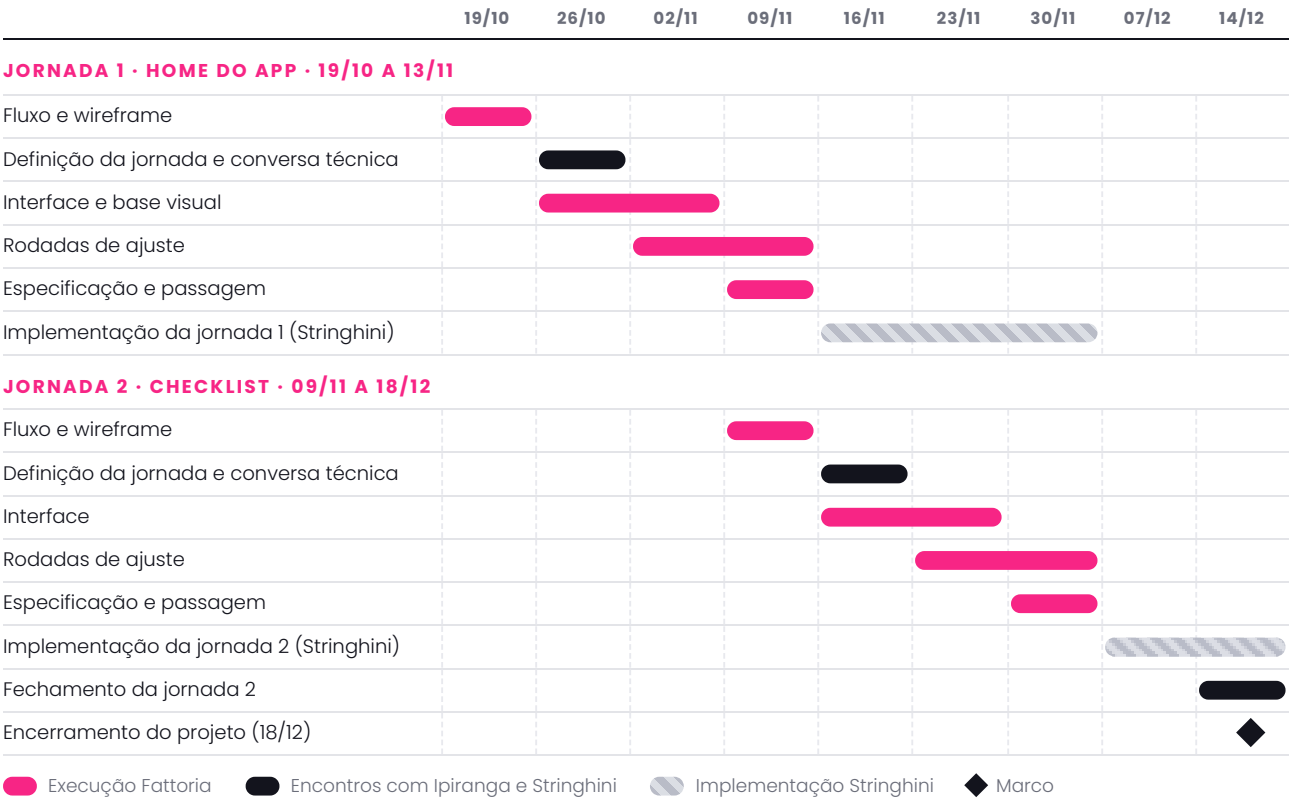

Interfaces e fluxos de cada jornada

JORNADA	INTERFACE OU FLUXO	O QUE RESOLVE
1 Home	**Contexto do dia:** conexão, sincronização e pendências do consultor logo na abertura do app.	Home com pouca informação para a rotina
1 Home	**Resumo da carteira:** andamento do quadrimestre, visitados e pendentes, e quanto falta para fechar a meta.	Meta controlada fora do app
1 Home	**Iniciar execução:** caminho direto da home para a próxima visita.	Muitos passos até começar o trabalho
1 Home	**Acessos rápidos:** Guia de Execução, visitas, dashboards e treinamentos.	Canais espalhados, cada um com seu caminho
2 Checklist	**Fluxo do checklist:** início a partir do posto, progresso, perguntas obrigatórias sinalizadas, navegação entre seções, salvar e retomar, e o Concluir só quando for possível concluir.	Pouca noção de progresso durante o checklist
2 Checklist	**Conclusão e relatório:** confirmação de envio e acesso ao relatório com nota preliminar ou final e status da auditoria.	Relatório difícil de encontrar e sem status
1 e 2 Estados de campo	**Sem conexão, sincronização pendente, vazio, erro e carregamento**, aplicados às telas das duas jornadas.	Dúvida sobre o que ficou salvo no aparelho

04 Equipe e investimento

A Fattoria dedica ao projeto um time com papéis fixos, liderado por quem já conhece os canais digitais da Coordenação. A Ipiranga contrata um pacote de horas por jornada, organizado conforme o cronograma das etapas.

Equipe

PAPEL	RESPONSABILIDADE	PARTICIPAÇÃO
Liderança de produto Bruno Branco · Lead Product Designer	Decisões de produto e experiência, definição das jornadas e alinhamento com a Ipiranga.	Encontros de definição, alinhamentos e aprovações
Product designer Dedicado ao projeto	Fluxos, interface, base visual e especificação.	Produção das duas jornadas
Ponte técnica Thiago Brito · Tech Lead	Viabilidade com a Stringhini, conversas técnicas e passagem das telas.	Conversas técnicas e passagens

Investimento

ITEM	ESCOPO	HORAS	VALOR
Jornada 1 19/10 a 13/11	Home do app (dashboard) e base visual	60h	R$ 12.000,00
Jornada 2 09/11 a 18/12	Checklist, conclusão e relatório	60h	R$ 12.000,00
Projeto R$ 200,00 por hora	**Duas jornadas, de 19/10 a 18/12**	**120h**	**R$ 24.000,00**

Condições de pagamento

MARCO	QUANDO	VALOR
Jornada 1 50%	Na assinatura da proposta	R$ 12.000,00
Jornada 2 50%	13/11, passagem da jornada 1 e início da produção da jornada 2	R$ 12.000,00

Os valores apresentados já contemplam impostos e tributos. O projeto pode utilizar os créditos do banco de horas da Ipiranga com a Fattoria, conforme combinado entre as partes. A Fattoria e seu time operam em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Validade da proposta: 30 dias.

05 Próximas jornadas

Com a home e o checklist entregues, a Ipiranga terá uma visão clara do ritmo da esteira e da resposta da Stringhini às entregas. Esse é o momento de planejar as próximas jornadas, seguindo o mesmo modelo ou acelerando o ritmo. Os itens abaixo, levantados no dossiê e na estratégia, formam a base desse planejamento.

ITEM	O QUE É	OBSERVAÇÃO
Arquitetura do hub	Estrutura completa de menus e seções, e o que leva aos canais especialistas.	
Minha carteira completa	Visitas por dia para fechar 100% e lista dos postos que faltam.	
Busca e seleção do posto	Busca direta por nome fantasia, razão social ou CNPJ, com status e data da última visita.	
Auditoria e contestação	O que a auditoria mudou e por quê, réplica do consultor e status da contestação.	
Central de notificações	Avisos de auditoria concluída, nota alterada e contestação respondida.	
Postos próximos e carteira em mapa	Postos mais perto do consultor e mapa com visitados e pendentes.	Depende de coordenadas e do serviço de mapa
Resumo do posto e visita anterior	Dados do posto, pendências e pontos de atenção da última visita.	Depende das bases disponíveis
Guia dentro da pergunta	Padrão correto aberto a partir de cada pergunta do checklist.	Depende da ligação entre pergunta e conteúdo
Checklist por setor e foto anexada depois	Perguntas na ordem do deslocamento físico e foto anexada mais tarde.	Depende do motor de formulários
Pendências, planos de ação e oportunidades	Pendências com responsável e prazo e registro de ações comerciais.	
Dashboard do coordenador no celular	Visão da equipe adaptada ao celular.	
Recursos com IA e novos canais	Assistente do Guia, validação de fotos, avisos por WhatsApp e roteirização.	

06 Como vamos saber se deu certo

Hoje não existe uma medição estruturada a partir de analytics, apenas alguns logs customizados. A Fattoria indica abaixo alguns KPIs como sinais de sucesso das duas jornadas, para que a evolução possa ser comprovada depois do lançamento. Novos indicadores podem ser levantados e incluídos durante a execução do projeto.

JORNADA	INDICADOR	COMO MEDIR
Home	Tempo entre abrir o app e iniciar uma execução	Eventos no app
Home	Uso dos acessos rápidos	Eventos no app
Checklist	Tempo médio para concluir um checklist	Eventos no app
Geral	Satisfação do consultor com as novas telas	Pesquisa curta depois do lançamento

07 Próximos passos

1. **Aprovação da proposta** e assinatura.
2. **Início em 19/10** com os fluxos e wireframes da home.
3. **Definição da jornada e conversa técnica** com Ipiranga e Stringhini, usando os wireframes como base.
4. **Primeira apresentação da home** na segunda semana do projeto.
