

App de Execução

Consultoria e redesign da experiência do app de Trade Marketing, com um norte para 2027 e a primeira fase no ar em dezembro

Ipiranga · Julio Araujo

Consultoria e UX/UI · Setembro de 2026

Proposta Comercial

Ipiranga · Julio Araujo

App de Execução · Setembro de 2026



01

Escopo



Cenário

Objetivo

Um norte para o app e a primeira fase redesenhada e no ar em dezembro

Entregáveis

Diagnóstico, roadmap, telas da Fase 1 no Figma e acompanhamento

Tempo estimado

11 semanas

O App de Execução é a ferramenta de campo dos consultores de Trade Marketing da Ipiranga, um PWA que funciona offline no celular Android e no notebook, desenvolvido e mantido pela Stringhini. Cada consultor recebe a carteira do ciclo, com uma tarefa por posto para cumprir em quatro meses, e preenche checklists que depois passam por auditoria.

A ferramenta foi construída a partir das necessidades do negócio, e as conversas com consultores e coordenadores mostram o custo disso na rotina: carteira sem mapa nem planejamento, informação do posto espalhada, relatório com etapas manuais e pouca visibilidade sobre a auditoria.

A Ipiranga quer que o app seja o apoio do consultor no dia a dia, com um projeto para apresentar e defender e a primeira fase implementada em dezembro. Propomos conduzir a consultoria e o redesign da experiência junto com a Stringhini, que segue responsável pela implementação.



O que ouvimos

Objetivo

Partir das dores reais da operação

Entregáveis

Ponto de partida do diagnóstico, a validar na imersão

Tempo estimado

Levantado em setembro de 2026

Pontos levantados nas reuniões de 18/09 e nas conversas com consultores e coordenadores:

- **Carteira:** 452 tarefas numa lista, sem mapa nem visão de postos próximos, e uma busca com mais cliques que nas versões anteriores.
- **Informação do posto:** dados da visita espalhados em sistemas diferentes e pendências de visitas anteriores difíceis de recuperar.
- **Checklist:** sequência que nem sempre segue a visita física, guia fora do fluxo, fotos obrigatórias que alongam a visita e um "Concluir" que não conclui.
- **Relatório e auditoria:** "Gerar relatório" escondido num menu, relatório sem dizer se já passou pela auditoria e envio individual por e-mail.
- **Home e conhecimento:** quatro banners estáticos e uma central de conteúdo sem contexto, sem dado sobre o que o consultor procura.
- **Gestão:** dashboard pensado para o notebook e registro de oportunidades comerciais ainda fora do app.



Escopo

Objetivo

Entender a rotina do consultor e os limites da plataforma

Entregáveis

Diagnóstico com jornada atual, dores e oportunidades

Tempo estimado

2 semanas · 56 horas

Frente 1: Imersão e diagnóstico

- **Materiais e dados:** estratégia do app, sugestões levantadas com consultores e logs da Stringhini: dispositivos, tempo de execução, reaberturas por checklist e uso offline.
- **Análise do produto:** avaliação heurística das jornadas do consultor, do auditor e do gestor, no celular e no notebook.
- **Conversas com o campo:** entrevistas remotas com até 6 consultores e 2 coordenadores, e o acompanhamento de uma visita a posto no Rio de Janeiro.
- **Leitura técnica com a Stringhini:** o que o PWA, o modo offline e as bibliotecas atuais permitem, para o desenho nascer dentro do possível.
- **Diagnóstico:** jornada atual, dores priorizadas e oportunidades, cruzando a visão do negócio com a do usuário.



Escopo

Objetivo

Dar ao app um norte que a Ipiranga possa apresentar e defender

Entregáveis

Visão, escopo da Fase 1, roadmap 2027 e apresentação

Tempo estimado

1 semana · 32 horas

Frente 2: Visão de produto e roadmap

- **Visão do app:** o papel da ferramenta na rotina do consultor, do coordenador e do gestor, e a relação com os outros canais digitais da Coordenação.
- **Priorização:** matriz de impacto e esforço montada com a Stringhini, separando o que entra em dezembro do que fica para 2027.
- **Escopo da Fase 1:** lista fechada de telas e fluxos, com critérios de aceite.
- **Roadmap 2027:** próximas fases com objetivo, dependências e ordem sugerida.
- **Material de defesa:** apresentação para a Ipiranga levar às áreas envolvidas.



Escopo

Objetivo

Redesenhar a rotina de campo do consultor

Entregáveis

Fluxos e wireframes das duas ondas

Tempo estimado

4 semanas · 72 horas

Frente 3: Redesign da Fase 1 em duas ondas

- **Onda 1, carteira e posto:** home com "Minha carteira" e indicadores do ciclo, postos próximos por geolocalização, carteira em mapa e lista, busca com menos cliques e o resumo do posto com nota, histórico, pendências e status da auditoria.
- **Onda 2, visita e resultado:** checklist na ordem da visita, com progresso, perguntas obrigatórias sinalizadas e o guia dentro do fluxo; relatório para visualizar e compartilhar, auditoria, contestação e notificações.
- **Fluxo antes da tela:** cada onda passa por fluxo e wireframe validados com a Ipiranga e a Stringhini antes da camada visual.
- **Escopo ajustável:** a lista final sai da Frente 2; um item novo, como o registro de oportunidades, entra no lugar de outro de mesmo tamanho.



Escopo

Objetivo

Transformar os fluxos em telas prontas para implementar

Entregáveis

Telas no Figma, UI kit e protótipo navegável

Tempo estimado

4 semanas · 96 horas

Frente 4: Interface e UI kit

- **Interface:** telas finais das duas ondas no Figma, para celular e notebook, com estados de vazio, erro, carregamento e modo offline.
- **Continuidade visual:** linguagem alinhada às ferramentas mais recentes da Coordenação, sem criar uma identidade nova.
- **UI kit:** componentes, cores, tipografia, ícones e gráficos documentados e adaptados às bibliotecas que a Stringhini já usa.
- **Protótipo navegável:** das jornadas principais, usado nos testes com consultores e na apresentação interna.



Escopo

Objetivo

Levar o desenho à implementação sem perder o que foi validado

Entregáveis

Testes, entrega por onda e revisão em homologação

Tempo estimado

6 semanas · 64 horas

Frente 5: Teste, entrega e acompanhamento

- **Testes com consultores:** uma rodada por onda, remota, com 5 consultores e o protótipo, e os ajustes que ela apontar.
- **Entrega para a Stringhini:** telas anotadas, especificação de componentes e comportamentos, e uma sessão de passagem por onda.
- **Acompanhamento da implementação:** revisão das telas em homologação e canal direto entre design e desenvolvimento até 18 de dezembro.
- **Indicadores:** definição, com a Stringhini, dos registros que medem o antes e o depois: tempo de visita, reaberturas e buscas na central.



Próximas fases

Objetivo

Deixar o caminho de 2027 desenhado

Entregáveis

Fases priorizadas no roadmap

Tempo estimado

A partir de janeiro de 2027

Candidatos ao roadmap 2027, a confirmar na Frente 2 e orçados à parte:

- **Dashboard no celular:** a visão de execução do coordenador e do gestor redesenhada para o celular, com os postos excelentes e críticos em destaque.
- **Registro de oportunidades:** novo tipo de tarefa para o consultor registrar expansão de valor, inaugurações e outras ações comerciais.
- **Assistente do guia:** busca em linguagem natural sobre a central de conhecimento, com o conteúdo ligado a cada item do checklist.
- **Validação de fotos:** análise automática das imagens da visita para apoiar a auditoria.
- **Notificações por WhatsApp:** mensagens padronizadas de auditoria e contestação no canal que o campo já usa.
- **Sincronização contínua:** continuar uma visita em outro aparelho sem perder o que foi preenchido.



Definições para iniciar

Objetivo

Destravar o kickoff

Entregáveis

Acessos, agenda de campo e limites técnicos

Tempo estimado

Antes da Frente 1

Pontos que precisamos alinhar com vocês antes do kickoff:

- **Acessos:** usuários em homologação com os perfis de consultor, auditor e gestor, e acesso aos logs e ao dashboard.
- **Campo:** contato de consultores e coordenadores para as entrevistas e os testes, e a visita a posto que vamos acompanhar.
- **Materiais:** estratégia do app, formulário do registro de oportunidades e o padrão visual das ferramentas da Coordenação.
- **Limites técnicos:** com a Stringhini, as bibliotecas de front-end e de gráficos em uso e o que o modo offline não permite.
- **Prazo de dezembro:** data de corte da implementação e janela de publicação, para fechar o tamanho da Fase 1.



Requisitos fora de escopo

Itens não contemplados nesta proposta, que podem ser orçados separadamente:

- Desenvolvimento, testes de código e publicação do app, que seguem com a Stringhini.
- Execução das fases do roadmap 2027, orçadas separadamente.
- Pesquisa quantitativa e visitas de campo fora do Rio de Janeiro. Deslocamentos, se necessários, a custo e com aprovação prévia.
- Produção de conteúdo para a central de conhecimento e revisão dos checklists e das regras de pontuação.
- Licenças de ferramentas de terceiros, como analytics, gravação de sessão ou WhatsApp Business API.



02

Nosso Processo



Metodologia

Objetivo

Cocriação com a Ipiranga e a Stringhini, sem gargalo

Entregáveis

Reunião semanal e grupo direto entre os times

Tempo estimado

11 semanas · inclui 32 horas de gestão

1

Imersão com o campo

Kickoff com a Ipiranga e a Stringhini, leitura dos dados e conversas com consultores e coordenadores.

2

Norte e prioridades

Visão do app, roadmap e escopo da Fase 1 fechados com a Ipiranga e validados tecnicamente com a Stringhini.

3

Design em duas ondas

Fluxo, wireframe e interface em ciclos semanais, com teste de cada onda com consultores.

4

Entrega e acompanhamento

Passagem por onda para a Stringhini e revisão da implementação em homologação até dezembro.



Roadmap


Objetivo

App de Execução,
Fase 1

Tempo estimado

11 semanas

Um cronograma mais detalhado será criado no início de cada bloco do projeto e seu acompanhamento será feito utilizando a metodologia Ágil com entregas e devolutivas constantes.

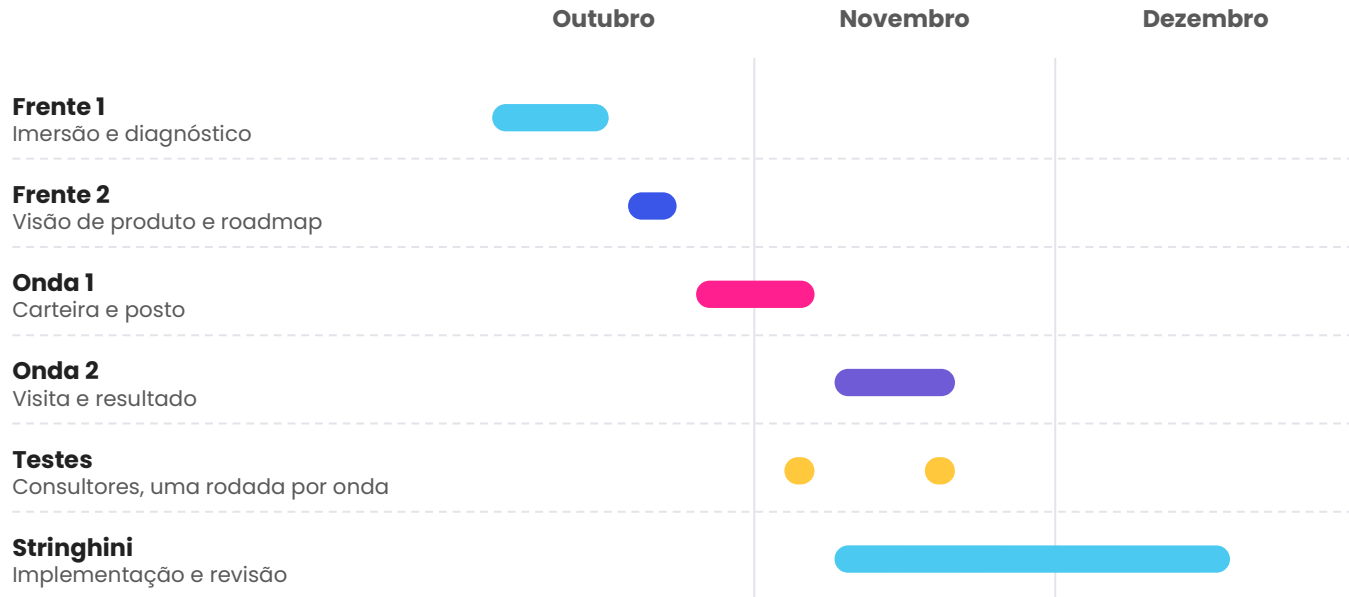

Datas contadas a partir de um kickoff em 5 de outubro. A implementação é conduzida pela Stringhini.



03

Investimento



Pagamento

Marcos de pagamento apresentados em detalhe ao lado

Atendimento

A Fattoria e seu time operam dentro do horário comercial de 2ª a 6ª feira, de 9 às 18h, operações fora do padrão acarretam em custos extras que precisam ser previamente acordados por ambas as partes antes da execução.

Impostos e Taxas

Os valores apresentados já contemplam impostos e tributos.

Validade da proposta

30 dias

Consultoria e redesign do App de Execução

352 horas: imersão, roadmap, redesign da Fase 1 e acompanhamento

R\$ 70.400,00

Condições de pagamento: divididas em marcos de entrega.

Assinatura da proposta (30%)

R\$ 21.120,00

Entrega da visão e do roadmap (30%)

R\$ 21.120,00

Entrega das telas da onda 2 (40%)

R\$ 28.160,00
