

App de Execução

Consultoria e redesign da experiência para fazer do app o hub do consultor de trade, com a primeira fase no ar em dezembro

Ipiranga · Julio Araujo

Consultoria e UX/UI · Setembro de 2026

Proposta Comercial

Ipiranga · Julio Araujo

App de Execução · Setembro de 2026



01

Escopo



Cenário

Objetivo

Tirar o hub do papel, com a primeira fase no ar em dezembro

Entregáveis

Conceito do hub, roadmap, telas da Fase 1 no Figma e acompanhamento

Tempo estimado

11 semanas

O App de Execução é a ferramenta de campo dos consultores de Trade Marketing da Ipiranga: um PWA com Guia de Execução, checklist, dashboard e a central "Posso Ajudar?", desenvolvido e mantido pela Stringhini desde 2023. Cada consultor precisa visitar 100% da carteira a cada quadrimestre, com um checklist por posto que depois passa por auditoria.

O estudo feito em agosto com consultores e coordenadores mostra que a rotina acontece em boa parte fora do app. O mapa da carteira fica no Spoke, no My Maps ou no KMV, a meta de visitas é calculada no caderno, as informações do posto vêm de outras bases e o relatório pós-visita vira PDF, planilha e e-mail, um posto por vez.

A estratégia da Ipiranga é transformar o app no hub de trabalho do consultor, a porta de entrada da rotina de campo. Propomos conduzir com a Ipiranga e a Stringhini o aprofundamento que a estratégia pede: imersão, arquitetura, conceito do hub, jornadas prioritárias e validação, com a primeira fase desenhada a tempo de ser implementada pela Stringhini em dezembro.



O que ouvimos

Objetivo

Partir da rotina real do consultor

Entregáveis

Base do trabalho, a aprofundar na Frente 1

Tempo estimado

Levantado entre agosto e setembro de 2026

Do estudo com 9 consultores e coordenadores (agosto) e das reuniões de 18/09:

- **Carteira fora do app:** mapa no Spoke, no My Maps, no KMV ou no Google Maps, e a meta de 100% no quadrimestre controlada no caderno, com a média diária calculada à mão.
- **Home passiva:** funcionalidades com o mesmo peso, sem dizer o que falta visitar, o que está perto ou o que pede atenção.
- **Posto sem contexto:** galonagem, Ipiranga Mais, mix, Jet Oil, AmPm, responsável e última visita espalhados em outras bases.
- **Checklist:** ordem por pilar que não segue o deslocamento no posto (crítico na rodovia), guia fora do fluxo e fotos que levam a visita a 30 ou 45 minutos.
- **Pós-visita:** PDF, planilha e e-mail montados um posto por vez para o consultor de negócios e o revendedor, sem saber se a auditoria já passou.
- **Conhecimento:** "Posso Ajudar?" como uma lista longa, com temas como o Ipiranga Mais espalhados em entradas soltas.



Como respondemos à estratégia

Objetivo

Seguir a direção que a Ipiranga já definiu

Entregáveis

Etapas da estratégia distribuídas nas cinco frentes

Tempo estimado

11 semanas

As etapas que o documento de estratégia pede ao parceiro e onde cada uma está nesta proposta:

- **Imersão na rotina e leitura do ecossistema:** Frente 1.
- **Arquitetura da informação e conceito de home:** Frente 2, partindo dos conceitos já desenhados no estudo de agosto.
- **Viabilidade e faseamento:** Frente 2, com a Stringhini, fechando o que vai para dezembro e o que fica para 2027.
- **Jornadas prioritárias:** Frentes 3 e 4, começando pelas quatro capacidades da primeira versão do hub: organizar a rotina, localizar postos, iniciar a execução e acessar os recursos prioritários.
- **Validação com usuários:** Frente 5, com consultores urbanos e de rodovia.
- **Premissas mantidas:** mobile first, offline como realidade, integração sem duplicar os canais especialistas e ação antes de informação.



Escopo

Objetivo

Completar o retrato da rotina e mapear o ecossistema

Entregáveis

Jornada atual, mapa do ecossistema e oportunidades prioritizadas

Tempo estimado

2 semanas · 48 horas

Frente 1: Imersão e leitura do ecossistema

- **Estudo de agosto como base:** leitura das entrevistas, das sugestões e da estratégia, sem refazer o que já foi ouvido.
- **Novos perfis:** entrevistas remotas com até 6 consultores dos perfis que faltam (rodovia, vários estados, carteira grande) e o acompanhamento de uma visita a posto no Rio de Janeiro.
- **Dados de uso:** logs da Stringhini: tempo de execução, reaberturas por checklist, uso offline, dispositivos e buscas.
- **Leitura do ecossistema:** o que entra no hub, o que aparece em resumo e o que leva a um canal especialista: visitas, dashboards de Trade, Clube do Milhão, Clube VIP, Ipiranga Mais e treinamentos.
- **Leitura técnica:** com a Stringhini, o que o PWA, o modo offline e as bases atuais permitem, incluindo os dados do posto.



Escopo

Objetivo

Transformar a estratégia em um conceito que a Ipiranga possa defender

Entregáveis

Arquitetura, conceito do hub, escopo da Fase 1 e roadmap

Tempo estimado

1 semana · 40 horas

Frente 2: Arquitetura, conceito do hub e faseamento

- **Arquitetura da informação:** organização de rotina, carteira, posto, execução, visitas, conhecimento e acessos, incluindo a central "Posso Ajudar?" segmentada por tema.
- **Conceito da home:** como a home mostra o contexto do dia, os postos próximos, o resumo recente, as prioridades, o botão de iniciar a execução e os acessos rápidos.
- **Faseamento com a Stringhini:** impacto e esforço de cada jornada, separando o que entra em dezembro do que fica para 2027.
- **Escopo da Fase 1 e roadmap 2027:** telas e fluxos fechados, com critérios de aceite, e as próximas fases em ordem.
- **Material de defesa:** apresentação para a Ipiranga levar às áreas envolvidas.



Escopo

Objetivo

Redesenhar as jornadas que comprovam o valor do hub

Entregáveis

Fluxos e wireframes das duas ondas

Tempo estimado

4 semanas · 72 horas

Frente 3: Jornadas da Fase 1 em duas ondas

- **Onda 1, organizar e localizar:** home do hub com "Minha carteira" e o ritmo diário para fechar o quadrimestre, postos próximos com busca manual no mesmo espaço, carteira em mapa e lista com status e marcas, e acessos rápidos.
- **Onda 2, preparar e executar:** resumo do posto com dados, última visita e pendências; checklist com o guia na própria pergunta, progresso e foto anexada depois; relatório enviado do app e status da auditoria.
- **Estados de campo:** sem localização, sem conexão e sincronização pendente previstos em cada fluxo.
- **Fluxo antes da tela:** cada onda passa por fluxo e wireframe validados com a Ipiranga e a Stringhini antes da camada visual.



Escopo

Objetivo

Transformar os fluxos em telas prontas para implementar

Entregáveis

Telas no Figma, UI kit e protótipo navegável

Tempo estimado

4 semanas · 96 horas

Frente 4: Interface e UI kit

- **Interface:** telas finais das duas ondas no Figma, mobile first e com a versão para notebook, incluindo estados de vazio, erro, carregamento e offline.
- **Continuidade visual:** linguagem alinhada às ferramentas mais recentes da Coordenação, sem criar uma identidade nova.
- **UI kit:** componentes, cores, tipografia, ícones, pins do mapa e gráficos documentados e adaptados às bibliotecas que a Stringhini já usa.
- **Protótipo navegável:** das jornadas principais, usado nos testes com consultores e na apresentação interna.



Escopo

Objetivo

Levar o desenho à implementação sem perder o que foi validado

Entregáveis

Validação, entrega por onda e revisão em homologação

Tempo estimado

6 semanas · 64 horas

Frente 5: Validação, entrega e acompanhamento

- **Validação com consultores:** uma rodada por onda, remota, com 5 consultores urbanos e de rodovia e o protótipo, e os ajustes que ela apontar.
- **Entrega para a Stringhini:** telas anotadas, especificação de componentes e comportamentos, e uma sessão de passagem por onda.
- **Acompanhamento da implementação:** revisão das telas em homologação e canal direto entre design e desenvolvimento até 18 de dezembro.
- **Sinais de sucesso:** com a Stringhini, os registros que medem o antes e o depois: tempo entre abrir o app e iniciar a execução, duração da visita e uso dos acessos rápidos.



Próximas fases

Objetivo

Deixar o caminho de 2027 desenhado

Entregáveis

Fases priorizadas no roadmap

Tempo estimado

A partir de janeiro de 2027

Candidatos ao roadmap 2027, o horizonte de evolução da estratégia, a confirmar na Frente 2 e orçados à parte:

- **Pendências e planos de ação:** responsável, prazo e acompanhamento entre visitas, no lugar das planilhas que os times mantêm hoje.
- **Principais ofensores por grupo:** consolidação dos problemas dos postos visitados, para preparar pedidos de material e a conversa com o revendedor.
- **Dados comerciais no resumo do posto:** Ipiranga Mais, KMV, Jet Oil e Clube do Milhão, conforme a maturidade das integrações.
- **Validação de evidências:** análise automática das fotos, online e após a sincronização offline.
- **Comunicação automática de resultados:** aviso de auditoria e contestação, inclusive por WhatsApp, e registro de oportunidades comerciais.
- **Visão do coordenador e assistente do guia:** dashboard no celular com filtro por consultor de negócios e busca em linguagem natural no conteúdo.



Definições para iniciar

Objetivo

Destravar o kickoff

Entregáveis

Acessos, dados disponíveis e agenda de campo

Tempo estimado

Antes da Frente 1

Pontos que precisamos alinhar com vocês antes do kickoff:

- **Acessos:** usuários em homologação com os perfis de consultor, auditor e gestor, e acesso aos logs e ao dashboard.
- **Dados do posto:** quais informações (galonagem, Ipiranga Mais, mix, marcas, responsável) a Stringhini consegue trazer até dezembro.
- **Canais especialistas:** lista de dashboards e plataformas que entram nos acessos rápidos, com os links e as regras de acesso.
- **Campo:** contato dos consultores para as entrevistas e os testes, e a visita a posto que vamos acompanhar.
- **Prazo de dezembro:** data de corte da implementação e janela de publicação, para fechar o tamanho da Fase 1.



Requisitos fora de escopo

Itens não contemplados nesta proposta, que podem ser orçados separadamente:

- Desenvolvimento, testes de código e publicação do app, e a integração de novas bases de dados, que seguem com a Stringhini.
- Revisão do conteúdo, da ordem das perguntas e das regras de pontuação dos checklists, conduzida pela Ipiranga com a Stringhini. O redesign prevê na interface a organização por setor do posto.
- Execução das fases do roadmap 2027, orçadas separadamente.
- Pesquisa quantitativa e visitas de campo fora do Rio de Janeiro. Deslocamentos, se necessários, a custo e com aprovação prévia.
- Produção de conteúdo para o Guia de Execução e a central de conhecimento.
- Licenças de ferramentas de terceiros, como analytics, gravação de sessão ou WhatsApp Business API.



02

Nosso Processo



Metodologia

Objetivo

Cocriação com a Ipiranga e a Stringhini, sem gargalo

Entregáveis

Reunião semanal e grupo direto entre os times

Tempo estimado

11 semanas · inclui 32 horas de gestão

1

Imersão e ecossistema

Kickoff com a Ipiranga e a Stringhini, leitura do estudo de agosto, dos dados de uso e novas conversas com o campo.

2

Conceito do hub e faseamento

Arquitetura, conceito da home e escopo da Fase 1 fechados com a Ipiranga e validados tecnicamente com a Stringhini.

3

Design em duas ondas

Fluxo, wireframe e interface em ciclos semanais, com validação de cada onda com consultores.

4

Entrega e acompanhamento

Passagem por onda para a Stringhini e revisão da implementação em homologação até dezembro.



Roadmap


Objetivo

App de Execução,
Fase 1

Tempo estimado

11 semanas

Um cronograma mais detalhado será criado no início de cada bloco do projeto e seu acompanhamento será feito utilizando a metodologia Ágil com entregas e devolutivas constantes.

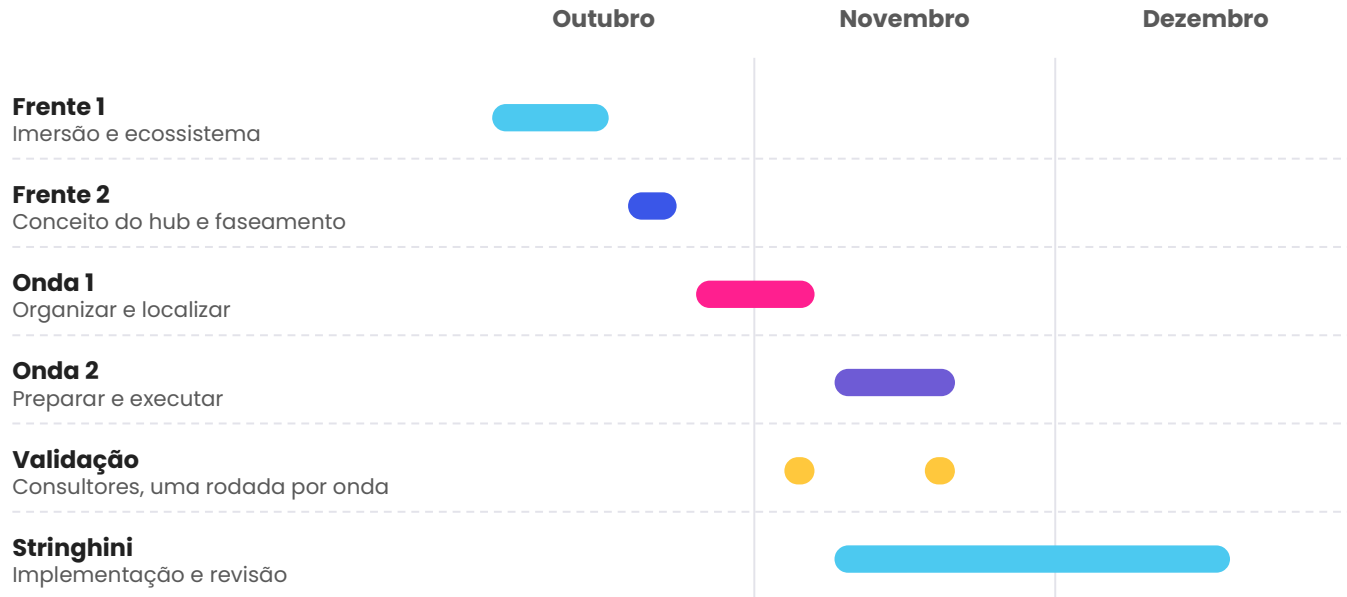

Datas contadas a partir de um kickoff em 5 de outubro. A implementação é conduzida pela Stringhini.



03

Investimento



Pagamento

Marcos de pagamento apresentados em detalhe ao lado

Atendimento

A Fattoria e seu time operam dentro do horário comercial de 2ª a 6ª feira, de 9 às 18h, operações fora do padrão acarretam em custos extras que precisam ser previamente acordados por ambas as partes antes da execução.

Impostos e Taxas

Os valores apresentados já contemplam impostos e tributos.

Validade da proposta

30 dias

Consultoria e redesign do App de Execução

352 horas: imersão, conceito do hub, Fase 1 e acompanhamento

R\$ 70.400,00

Condições de pagamento: divididas em marcos de entrega.

Assinatura da proposta (30%)

R\$ 21.120,00

Entrega do conceito do hub e do faseamento (30%)

R\$ 21.120,00

Entrega das telas da onda 2 (40%)

R\$ 28.160,00
